



# REPORT EXECUÇÃO DE PROJETOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (MG)

Nº 04

31/03/2025

*Clique no mapa ao lado e navegue por região*

*[Clique aqui](#) para acessar os projetos que abrangem toda a bacia*

*[Clique aqui](#) para acessar o sumário de projetos*

*Report produzido e alimentado pelas Gerências de Integração e Projetos da Agência Peixe Vivo*





*A seguir, você encontrará informações sobre os projetos em andamento, os que foram recentemente concluídos e uma prévia das iniciativas futuras.*

*O objetivo é apresentar um panorama claro das atividades e dos avanços que estão sendo feitos, destacando os resultados alcançados e as próximas etapas.*

## **TODA A BACIA DO VELHAS**

1. PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITÁ-PACUÍ
2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 5º ADITIVO
3. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS
4. BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS
5. GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAS URBANOS
6. MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA
7. **EM BREVE NA BACIA DO RIO DAS VELHAS**

## **ALTO RIO DAS VELHAS**

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS – MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ
2. **EM BREVE NO ALTO RIO DAS VELHAS**

## **MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS**

1. PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)
2. PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 1)
4. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
5. **EM BREVE NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS**

## **MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS**

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG
2. **EM BREVE NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS**

## **BAIXO RIO DAS VELHAS**

1. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG
2. EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG
3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – JABOTICATUBAS E OURO PRETO (LOTE 2)
4. **EM BREVE NO BAIXO RIO DAS VELHAS**

# TODA A BACIA DO VELHAS



## PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS E DA BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ



### LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIA DO RIO DAS VELHAS (SF5)  
BACIA DOS RIOS JEQUITAÍ-PACUÍ (SF6)



### EMPRESA CONTRATADA

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/08/2023



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 1.701.792,02



### DURAÇÃO DO PROJETO

19 MESES



### VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25

R\$ 1.224.271,18



### NÚMERO DO CONTRATO

020/2022



### PRÓXIMAS ETAPAS

Consolidação da proposta de metas e alternativas de enquadramento da SF5 e Programa de efetivação da SF6 concluído



FISCAL TÉCNICO APV  
JOÃO PAULO COIMBRA



PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO



OBS: ESTA É UMA CONTRATAÇÃO DO CBHSF NA QUAL O CBH DO RIO DAS VELHAS É BENEFICIÁRIO



# TODA A BACIA DO VELHAS



## PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO DAS VELHAS – 6º ADITIVO



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
TANTO COMUNICAÇÃO LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
12/09/2019



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 8.230.145,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
66 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 8.032.906,15



**NÚMERO DO CONTRATO**  
010/2019




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
1 Continuidade das ações de comunicação  
2 Aguardando nova licitação



**FISCAL TÉCNICO APV**  
DANIEL BRITO



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# TODA A BACIA DO VELHAS



## CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO CORPORATIVO (LOGÍSTICAS)



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
KEPLER VIAGENS, EVENTOS E  
TURISMO EIRELI – ME



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
20/05/2022



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 405.705,84



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
36 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 319.793,79



**NÚMERO DO CONTRATO**  
020/2022





**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Atendimento às reuniões, eventos e  
visitas técnicas do Comitê



**FISCAL TÉCNICO APV**  
SAMELA BITENCOURT



**PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO**

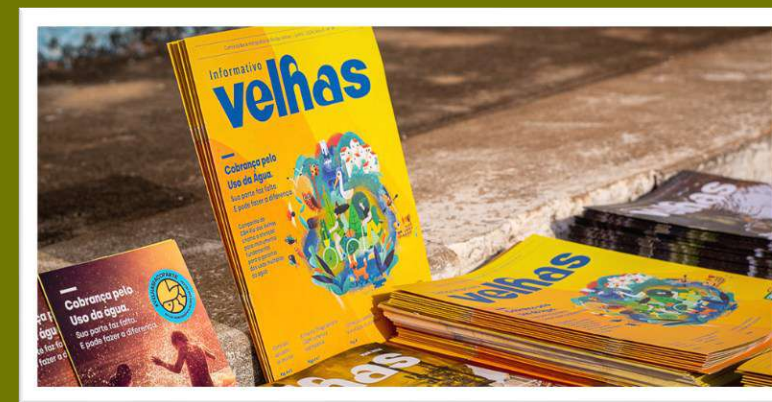

# TODA A BACIA DO VELHAS



## BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
FUNDEP



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
28/02/2020



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 4.638.178,74



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
60 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 3.168.542,88



**NÚMERO DO CONTRATO**  
001/2020




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Entrega do Produto 10  
Avaliação do Produto 10



**FISCAL TÉCNICO APV**  
JOÃO COIMBRA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# TODA A BACIA DO VELHAS



## GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA), CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA (PCPA), SANEAMENTO RURAL E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE MANANCIAS URBANOS



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
24/04/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 1.315.258,54



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
12 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 894.375,84



**NÚMERO DO CONTRATO**  
011/2024



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Elaboração de termos de referência, produção de pareceres técnicos e fiscalização das obras do Programa de Conservação e Produção de Água e do Programa de Saneamento Rural



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**





# TODA A BACIA DO VELHAS



## MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CBH VELHAS NAS 23 UTES EXISTENTES NA BACIA



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
TODA A BACIA HIDROGRÁFICA



**EMPRESA CONTRATADA**  
TANTO DESIGN LTDA



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
15/02/2023



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 3.150.351,85



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
24 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 2.535.229,69



**NÚMERO DO CONTRATO**  
004/2023




**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Avaliação do produto 22



**FISCAL TÉCNICO APV**  
DIMAS SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**





EM BREVE

## EM TODA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

# ALTO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ALTO VELHAS - MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
OURO PRETO (MG)  
MICROBACIA DO RIO MARACUJÁ  
UTE NASCENTES



**EMPRESA CONTRATADA**  
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
31/07/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 4.766.653,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
26 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ JANEIRO/25**  
R\$ 2.357.998,25



**NÚMERO DO CONTRATO**  
024/2024



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
8º boletim de medição



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME GUERRA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



## NO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA MELHORIA DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MANGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG – UTE RIBEIRÃO DO ONÇA  
RESULTADO: LICITAÇÃO DESERTA

# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MUNICIPAL ANDREQUICÉ E DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS (RVSEM)



### LOCAL DE EXECUÇÃO

SANTA LUZIA /MG E LAGOA SANTA/MG  
UTE PODEROSO VERMELHO,  
UTE CARSTE, UTE RIO TAQUARAÇU



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

01/11/2023



### DURAÇÃO DO PROJETO

15 MESES



### NÚMERO DO CONTRATO

043/2023



FISCAL TÉCNICO APV  
JOÃO PAULO COIMBRA



### EMPRESA CONTRATADA

DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 593.813,64



### VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25

R\$ 593.813,64



### PRÓXIMAS ETAPAS

1 PM RVSEM aprovado na CPB/COPAM


2 PM APAM aprovado no CODEMA Santa Luzia

PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO

100%



# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO SOBRADO (PESS)



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
SÃO JOSÉ DA LAPA/MG  
UTE RIBEIRÃO DA MATA



**EMPRESA CONTRATADA**  
DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
01/11/2023



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 419.736,92



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
15 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 419.736,92



**NÚMERO DO CONTRATO**  
048/2023



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
1 Entregue para IEF  
2 Pendente de aprovação na CPB/COPAM




**FISCAL TÉCNICO APV**  
JOÃO PAULO COIMBRA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 1)



### LOCAL DE EXECUÇÃO

OURO PRETO (MG) – MACIEL  
UTE NASCENTES  
JABOTICATUBAS (MG) – SÃO JOSÉ DA SERRA  
UTE JABÓ/BALDIM



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

18/03/2024



### DURAÇÃO DO PROJETO

10 MESES



### NÚMERO DO CONTRATO

008/2024



FISCAL TÉCNICO APV  
GUILHERME SILVA



### EMPRESA CONTRATADA

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESTAÇÕES  
SUSTENTÁVEIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 326.700,00



### VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25


R\$ 179.685,00



### PRÓXIMAS ETAPAS

Revisão do Produto 3

PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO



# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



### LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)  
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)  
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)  
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



### EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

17/01/2025



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 463.024,62



### DURAÇÃO DO PROJETO

09 MESES



### VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25

R\$ 46.302,46



### NÚMERO DO CONTRATO

085/2024



### PRÓXIMAS ETAPAS


Entrega dos cadastros de famílias



FISCAL TÉCNICO APV  
FERNANDA LAURINDA



### PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas





# MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS, CAETÉ MG.



### LOCAL DE EXECUÇÃO

CAETÉ/MG  
UTE RIO TAQUARAÇU



### EMPRESA CONTRATADA

PROBIOMAS PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

24/02/2025



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 4.179.000,00



### DURAÇÃO DO PROJETO

18 MESES




### VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25

R\$ 0,00



### NÚMERO DO CONTRATO

005/2025



### PRÓXIMAS ETAPAS



1º Relatório mensal de execução de obras



FISCAL TÉCNICO APV  
FERNANDA LAURINDA



PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO

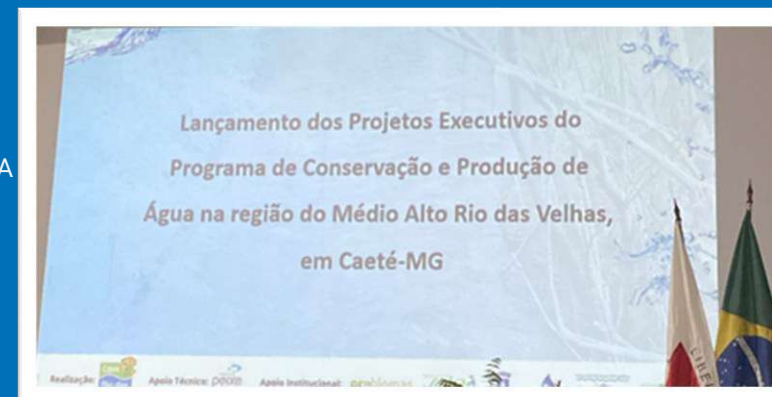



## NO MÉDIO ALTO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG – UTE JABÓ/BALDIM
2. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ/MG – UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ
3. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE ESMERALDAS/MG – UTE RIBEIRÃO DA MATA

# MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, CONGONHAS DO NORTE/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
CONGONHAS DO NORTE (MG)  
COMUNIDADE LAGOA  
UTE RIO CIPÓ, UTE RIO PARAÚNA



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
13/09/2024



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
06 MESES



**NÚMERO DO CONTRATO**  
052/2024



**FISCAL TÉCNICA APV**  
FLÁVIA MENDES



**EMPRESA CONTRATADA**  
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 835.250,60




**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 812.712,67



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário

**PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO**



# MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS



## IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, NA MICROBACIA DO CÓRREGO SOBERBO – UTE RIO CIPÓ, EM SANTANA DO RIACHO/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
SANTANA DO RIACHO/MG  
UTE RIO CIPÓ



**EMPRESA CONTRATADA**  
CONSTRUTORA JOAMAR LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
23/01/2025



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 7.188.000,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
18 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 0,00



**NÚMERO DO CONTRATO**  
004/2025



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



**FISCAL TÉCNICA APV**  
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL  
DE EXECUÇÃO**



## NO MÉDIO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COLETIVO PARA O MUNICÍPIO DE INIMUTABA/MG – UTE SANTO ANTÔNIO/MAQUINÉ

# BAIXO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NO BAIXO VELHAS, VÁRZEA DA PALMA/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
VÁRZEA DA PALMA (MG)  
MICROBACIA CÓRREGO PEDRAS GRANDES  
UTE GUAICÚ



**EMPRESA CONTRATADA**  
FORTAL ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
23/07/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 3.336.000,00



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
36 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 1.673.688,62



**NÚMERO DO CONTRATO**  
036/2024



**PRÓXIMAS ETAPAS**  
7º boletim de medição emitido  
8º boletim de medição



**FISCAL TÉCNICO APV**  
GUILHERME SILVA



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**



# BAIXO RIO DAS VELHAS



## EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DIAMANTINA/MG



**LOCAL DE EXECUÇÃO**  
DIAMANTINA (MG)  
COMUNIDADE BATATAL  
UTE RIO PARDO



**EMPRESA CONTRATADA**  
APLICAR ENGENHARIA LTDA.



**DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)**  
13/09/2024



**VALOR GLOBAL DO CONTRATO**  
R\$ 2.087.619,80



**DURAÇÃO DO PROJETO**  
08 MESES



**VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25**  
R\$ 896.578,33



**NÚMERO DO CONTRATO**  
051/2024





**PRÓXIMAS ETAPAS**  
Execução de obras de soluções individuais de esgotamento sanitário



**FISCAL TÉCNICO APV**  
FLÁVIA MENDES



**PERCENTUAL DE EXECUÇÃO**

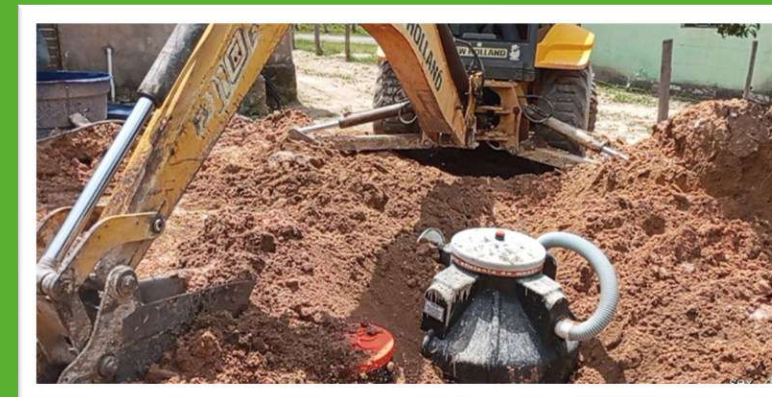

# BAIXO RIO DAS VELHAS



## ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM MÓDULOS INDIVIDUAIS EM LOCALIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 2)



### LOCAL DE EXECUÇÃO

FUNILÂNDIA (MG) – TRONQUEIRAS (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)  
JEQUITIBÁ (MG) – DOUTOR CAMPOLINA (UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ)  
MORRO DA GARÇA (MG) – RIACHINHO (UTE RIO BICUDO)  
BALDIM (MG) – JOÃO DA COSTA (UTE JABÓ/BALDIM)



### EMPRESA CONTRATADA

DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.



### DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

17/01/2025



### VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 463.024,62



### DURAÇÃO DO PROJETO

09 MESES



### VALOR EXECUTADO ATÉ MARÇO/25

R\$ 46.302,46



### NÚMERO DO CONTRATO

085/2024



### PRÓXIMAS ETAPAS


Entrega dos cadastros de famílias



FISCAL TÉCNICO APV  
FERNANDA LAURINDA



### PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



OBS: O Contrato 085/2024 abrange municípios de diferentes regiões fisiográficas da bacia: Baixo e Médio Alto Rio das Velhas







EM BREVE

## NO BAIXO RIO DAS VELHAS

1. SEM NOVOS PROJETOS PREVISTOS

# EXPEDIENTE

## CBH DO RIO DAS VELHAS

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho  
**Presidenta**

Ronald de Carvalho Guerra  
**Vice-presidente**

Renato Junio Constâncio  
**Secretário**

Heloisa Cristina França Cavaliéri  
**Secretário Adjunto**

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Gustavo Henrique Costa Simões  
**Presidente do Conselho de Administração**

Rúbia Santos Barbosa Mansur  
**Diretora Geral Interina**

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos  
**Gerente de Administração e Finanças**

Jacqueline Evangelista Fonseca  
**Gerente de Projetos Interina**

Ohany Vasconcelos Ferreira  
**Gerente de Integração Interina**

André Amaral Horta  
**Gerente de Gestão Estratégica**

Daniel Alexandre de Brito  
**Analista de comunicação**  
*Produção, projeto gráfico e revisão final*

João Paulo Paulino Coimbra  
**Coordenador Técnico**  
*Produção e revisão final*



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060  
[www.cbhvelhas.org.br](http://www.cbhvelhas.org.br) | @cbhriodasvelhas

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060  
[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | @agenciapeixevivo



**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS**

Rua Dos Carijós, 244 – Sala 622 – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

[www.cbhvelhas.org.br](http://www.cbhvelhas.org.br) | [@cbhriodasvelhas](https://www.instagram.com/cbhriodasvelhas)

**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro,  
Belo Horizonte (MG) - CEP 30.120-060

[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | [@agenciapeixevivo](https://www.instagram.com/agenciapeixevivo)
